

Oficina de General de Planeamiento y Presupuesto




Ing. Fabiola Amaya Santivañez
Jefa de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto

Presupuesto 2024

Ing. Fabiola Amaya Santivañez
Jefa de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto


Ingresos 2024

En el 2024, la MD Samegua tuvo un Presupuesto Total a **nivel de ingresos de PIA de S/. 21,966,214**, tiene un **PIM de S/. 45,400,900** por toda fuente de financiamiento a **recursos determinados, se tuvo un PIA S/. 20,381,434 y un PIM de S/ 39,218,129**, de los cuales a nivel desagregado de **canon y regalías de S/. 18,356,614 y un PIM de S/ 36,354,079**

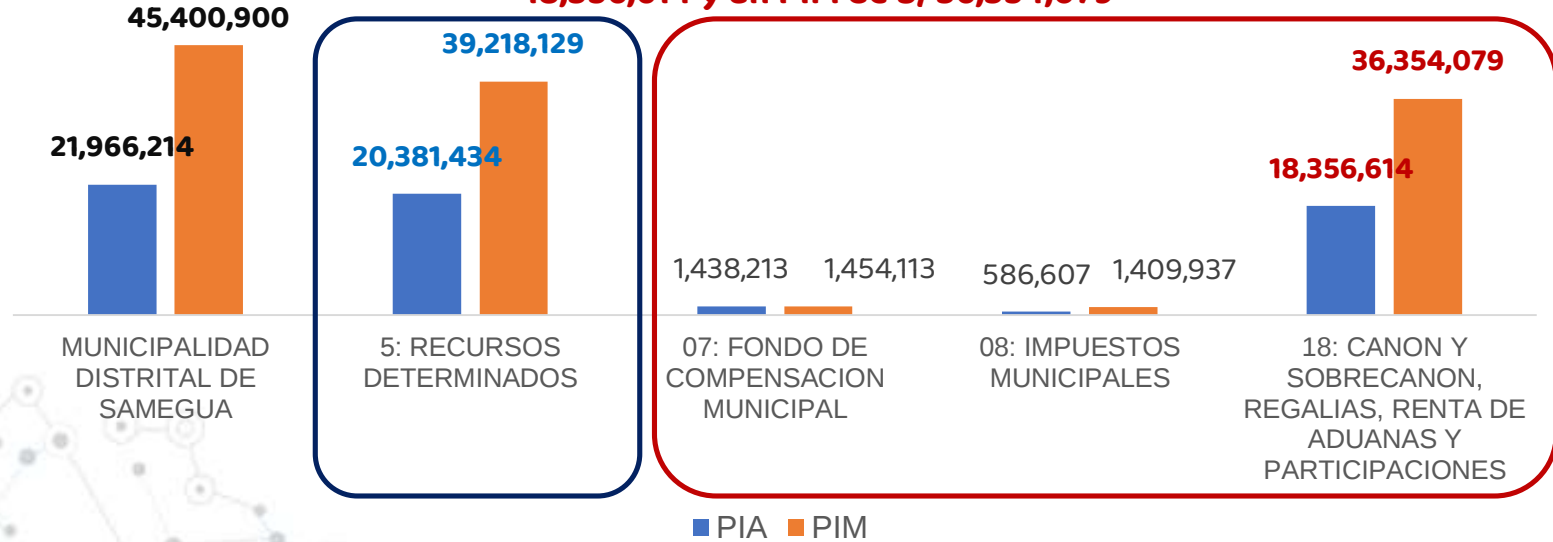


Presupuesto total ejecutado 2024

En el 2024, la MD Samegua tuvo un Presupuesto Total de **PIA de S/. 22,642,890**, tiene un **PIM de S/. 46,160,480** y tuvo una **ejecución de S/. 41,721,239** con un **avance de 90.4%**, por toda fuente de financiamiento ubicándose en el 2do lugar a nivel regional y 2do a nivel provincial entre todos los gobiernos locales

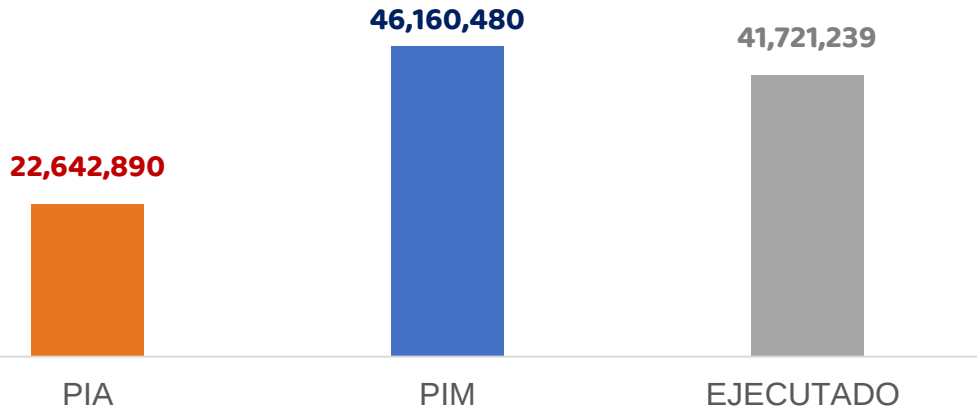

Presupuesto total 2024 por toda fuente de financiamiento por actividades y proyectos

En el 2024, Por la Fte Fto Recursos Determinados se tuvo un **PIA de S/. 20,381,434**, tiene un **PIM de S/. 39,218,129** y tuvo una **ejecución de S/. 35,221,324** con un **avance de 89.8%**, ubicándose en el 7mo lugar a nivel regional y 2do a nivel provincial entre todos los gobiernos locales

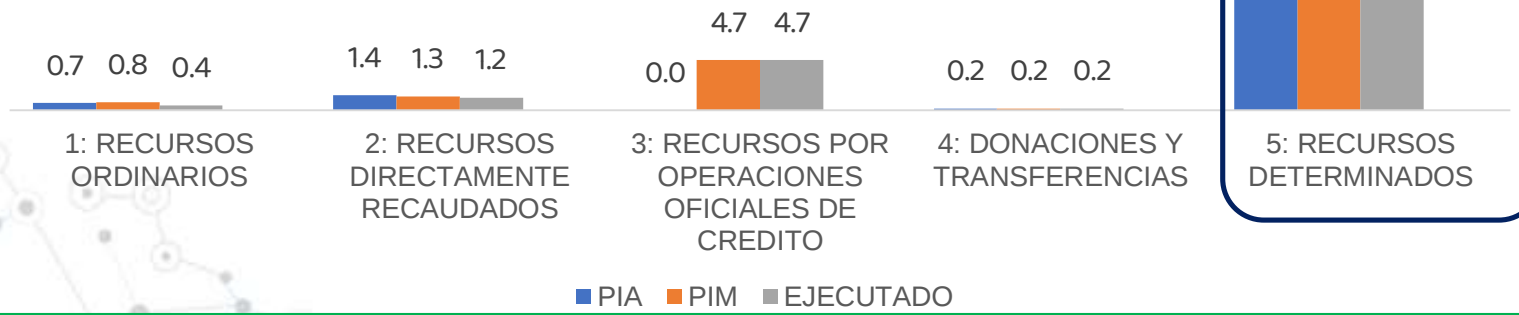

Presupuesto total 2024 por toda fuente de financiamiento por proyectos

En el 2024, A nivel de proyectos, se tuvo un **PIA de S/. 11,037,751**, tiene un **PIM de S/. 29,521,551** y tuvo una **ejecución de S/. 25,997,905** con un **avance de 88.1%**, ubicándose en el 7mo lugar a nivel regional y 2do a nivel provincial entre todos los gobiernos locales




Presupuesto total 2024 por proyectos según función

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA	11,037,751	29,521,551	25,997,905	88.1
Función	PIA	PIM	EJECUTADO	Avance %
15: TRANSPORTE	2,915,400	9,043,210	8,617,621	95.3
22: EDUCACION	2,000,364	8,160,467	6,035,138	74.0
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,064,387	4,218,162	3,919,729	92.9
18: SANEAMIENTO	5,057,600	4,165,302	3,669,011	88.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	2,196,143	2,115,139	96.3
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	915,680	901,358	98.4
14: INDUSTRIA	0	227,648	227,646	100.0
10: AGROPECUARIA	0	210,388	210,388	100.0
08: COMERCIO	0	150,961	150,961	100.0
21: CULTURA Y DEPORTE	0	135,325	82,389	60.9
23: PROTECCION SOCIAL	0	49,147	49,147	100.0
17: AMBIENTE	0	49,118	19,378	39.5

Presupuesto total 2024 por proyectos

En el 2024, la MD Samegua tuvo un Presupuesto para proyectos de **PIA de S/. 11,037,751**, tiene un **PIM de S/. 29,521,551** y tuvo una **ejecución de S/. 25,997,905** con un **avance de 88.1%**, por recursos determinados en los que se incluye recursos del canon minero, correspondiente al gasto de activos no financieros

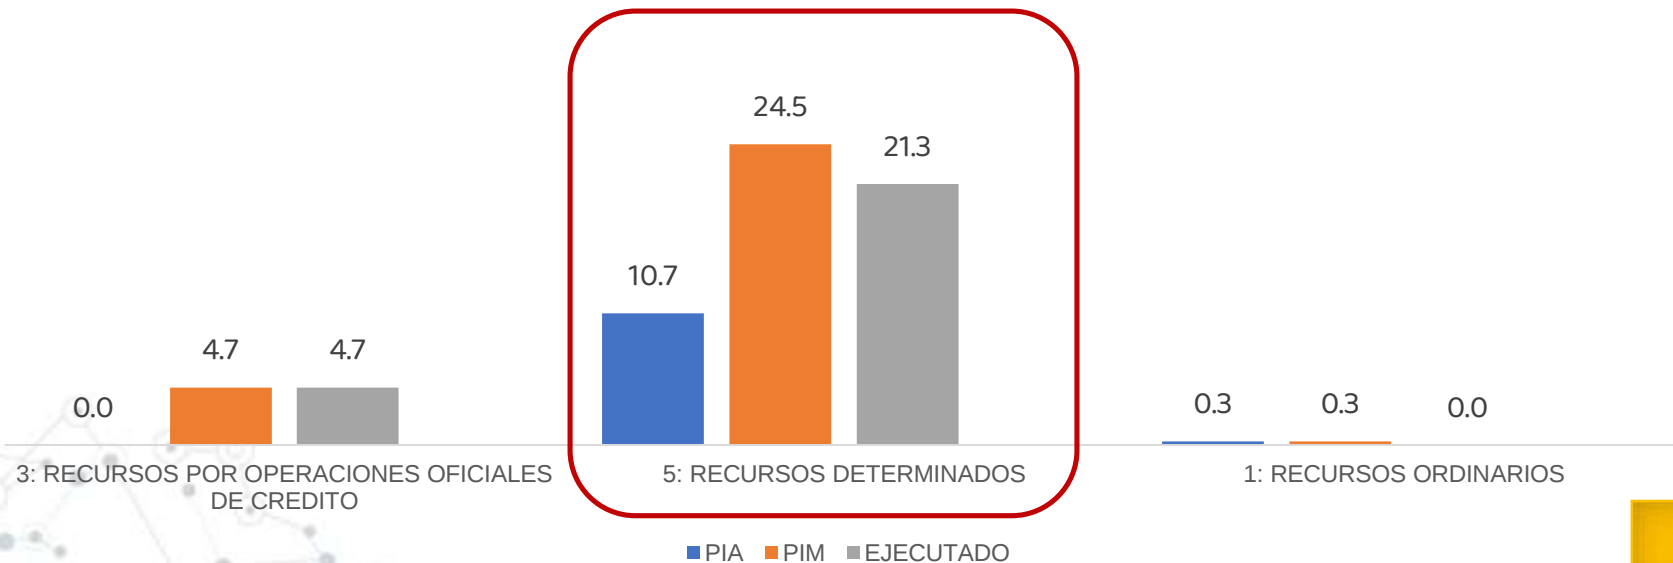

Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados 2026-2028

Ejecución 2024 de proyectos por activos no financieros según tipo de función

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA	11,037,751	29,521,551	25,997,905	88.1
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,037,751	29,521,551	25,997,905	88.1
Rubro 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	10,737,994	24,526,743	21,302,854	86.9
Función	PIA	PIM	EJECUTADO	Avance %
22: EDUCACION	1,700,607	7,860,710	6,035,138	76.8
15: TRANSPORTE	2,915,400	4,348,159	3,922,570	90.2
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,064,387	4,218,162	3,919,729	92.9
18: SANEAMIENTO	5,057,600	4,165,302	3,669,011	88.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	2,196,143	2,115,139	96.3
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	915,680	901,358	98.4
14: INDUSTRIA	0	227,648	227,646	100.0
10: AGROPECUARIA	0	210,388	210,388	100.0
08: COMERCIO	0	150,961	150,961	100.0
21: CULTURA Y DEPORTE	0	135,325	82,389	60.9
23: PROTECCION SOCIAL	0	49,147	49,147	100.0
17: AMBIENTE	0	49,118	19,378	39.5

Sub Gerencia de Infraestructura



Ing. Kenide Glen Puma Espinoza
Sub Gerente de Infraestructura

Consolidados de Proyectos ejecutados en el PP 2024

Sector	Costo actualizado total (S/)	Programación 2024	Devengado 2024	Saldo por ejecutar 2024	Devengado acumulado	Saldo acumulado	N° de proyectos
EL Molino	1,668,968.72	703,681.00	587,742.45	115,938.55	628,656.05	1,040,312.67	1
Cerrillos	26,683,683.74	7,434,663.00	6,696,850.90	737,812.10	22,453,414.98	4,230,268.76	3
JV Desarrollo or Samegua	1,248,280.61	315,777.00	213,030.11	102,746.89	213,030.11	1,035,250.50	1
Olleria	5,741,888.57	1,655,651.00	1,234,878.93	420,772.07	1,386,398.37	4,355,490.20	2
Samegua	51,056,448.60	12,488,937.49	10,370,241.30	2,118,696.19	35,881,212.75	15,175,235.85	8
Total	86,399,270.24	22,598,709.49	19,102,743.69	3,495,965.80	60,562,712.26	25,836,557.98	15

En el 2024, la SGI ejecutó 15 proyectos por un monto programado en el 2024 de S/. 22.5 millones , ejecutando un total de S/. 19.1 millones. Quedando un saldo acumulado por ejecutar de S/. 25.8 millones

Consolidados de Proyectos ejecutados en relación a priorización del PP 2024

Función	Costo actualizado total (S/)	Programación 2024	Devengado 2024	Saldo por ejecutar 2024	Devengado acumulado	Saldo acumulado	N° de proyectos
Educación	30,151,562.42	7,860,710.00	6,035,138.07	1,825,571.93	15,982,029.94	14,279,186.01	2
Orden Publico y Seguridad	2,232,030.86	71,590.00	71,281.20	308.80	71,281.20	2,160,749.66	1
Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia	2,700,132.41	1,052,672.49	198,064.56	854,607.93	1,853,524.48	846,607.93	1
Saneamiento	12,409,967.97	3,992,520.00	3,601,796.50	390,723.50	9,517,773.34	2,782,541.10	4
Transporte	38,905,576.58	9,621,217.00	9,196,463.36	424,753.64	33,138,103.30	5,767,473.28	7
Total	86,399,270.24	22,598,709.49	19,102,743.69	3,495,965.80	60,562,712.26	25836557.98	15

En el 2024, la SGI ejecutó 15 proyecto, destinando el 42.57% del total de presupuesto 2024, a la función transporte, es decir S/. 9,621,217.00, asimismo se ha destinado el 34.78% al función educación , es decir S/. 7,860,710.00, asimismo el 17.67% destinado a obras de saneamiento, es decir S/. 3,992,520.00 y el 4.97% a funciones de planeamiento, orden y seguridad a nivel distrital, es decir S/. 1,124,262.49. Ejecutando un total de S/. **19,102,743.69**

Proyectos ejecutados 2024

ANTES



DESPUÉS



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JUAN BAUTISTA SCARSI VALDIVIA DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

CUI N° 2447489

- Brecha a la que responde : Infraest. Educativa
- Monto de inversión actualizado : S/. 23,319,928.84
- Devengado acumulado : S/. 12,496,195.00
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 4,237,840.00
- Avance físico : 36.30%
- Avance Financiero : 53.59%

Proyectos ejecutados 2024

ANTES



DESPUÉS



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE CERRILLOS DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

CUI N° 2496252

- Brecha a la que responde : Serv. De Agua Potable Urbano
- Monto de inversión actualizado : S/. 3,776,008.16
- Devengado acumulado : S/. 3,666,355.00
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 1,175,284.00
- Avance físico : 99.68 %
- Avance Financiero : 97.10 %

Proyectos ejecutados 2024



ANTES



DESPUÉS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE SAMEGUA DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

CUI N° 2495766

- Brecha a la que responde : Serv. De Movilidad Urbana
- Monto de inversión actualizado : S/. 10,258,697.08
- Devengado acumulado : S/. 9,757,954.90
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 4,695,051.00
- Avance físico : 95.54 %
- Avance Financiero : 95.12 %

Proyectos ejecutados 2024

ANTES



**RECUPERACION DEL DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE
PEATONAL EN EL ANEXO EL COMÚN, SECTOR OLLERÍA DE LA JUNTA
VECINAL SAN ISIDRO LABRADOR DISTRITO DE SAMEGUA -
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.**

CUI N° 2557823

- Brecha a la que responde : Serv. De Transito Peatonal Interurbano o Rural
- Monto de inversión actualizado : S/. 3,357,941.47
- Devengado acumulado : S/. 426,477.51
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 274,958.07
- Avance físico : 2.74 %
- Avance Financiero : 12.70 %

DESPUÉS



Proyectos ejecutados 2024

ANTES



DESPUÉS



**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA
I.E. N° 356 DE LA JUNTA VECINAL CERRILLOS SANTA FORTUNATA,
SECTOR CERRILLOS DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

CUI N° 2549816

- Brecha a la que responde : Infraest. Educativa
- Monto de inversión actualizado : S/. 6,831,633.58
- Devengado acumulado : S/. 3,485,835.16
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 2,797,297.86
- Avance físico : 36.54 %
- Avance Financiero : 51.02 %

Proyectos ejecutados 2024



CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD; EN EL(LA) ROMPEMUELLES EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

CUI N° 2637133

- Brecha a la que responde : Servicio De Transporte Urbano
- Monto de inversión actualizado : S/. 530,975.89
- Devengado acumulado : S/. 498,080.38
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 498,080.38
- Avance físico : 87.15 %
- Avance Financiero : 93.80 %

Proyectos ejecutados 2024

ANTES



**CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA EN EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**

CUI N° 2588639

- Brecha a la que responde : Servicio Agua Potable Urbano
- Monto de inversión actualizado : S/. 2,383,947.10
- Devengado acumulado : S/. 959,920.86
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 959,920.86
- Avance físico : 29.53 %
- Avance Financiero : 40.27 %

DESPUÉS



Proyectos ejecutados 2024



ANTES



DESPUÉS

CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MOLINO DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

CUI N° 2589192

- Brecha a la que responde : Servicio Agua Potable Urbano
- Monto de inversión actualizado : S/. 1,668,968.72
- Devengado acumulado : S/. 628,656.05
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 587,742.45
- Avance físico : 30.31 %
- Avance Financiero : 37.67 %

Proyectos ejecutados 024



RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA, EN PISTAS Y VEREDAS EN CALLES, MISTI, MICAELA BASTIDAS, PACHACUTEC, INMACULADA CONCEPCIÓN Y CALLE 8 DE NOVIEMBRE, JUNTA VECINAL DESARROLLO POR SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

CUI N° 2628365

- Brecha a la que responde : Servicio de Transporte Urbano
- Monto de inversión actualizado : S/. 1,248,280.61
- Devengado acumulado : S/. 213,030.11
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 213,030.11
- Avance físico : 2.89 %
- Avance Financiero : 17.07 %

Proyectos ejecutados 2024

ANTES



DESPUÉS



**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL
EN LA NUEVA BASE DE SERENAZGO DEL DISTRITO DE SAMEGUA DE
LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA**

CUI N° 2628215

- Brecha a la que responde : Servicio de Seguridad Ciudadana Local
- Monto de inversión actualizado : S/. 2,232,030.86
- Devengado acumulado : S/. 71,281.20
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 71,281.20
- Avance físico : 0.00 %
- Avance Financiero : 3.19 %

Proyectos ejecutados 2024



ADQUISICION DE CARGADOR FRONTAL, CAMION CISTERNA Y CAMIONETA; REPARACION DE VOLQUETE; EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

CUI N° 2548526

- Brecha a la que responde : Servicio Operativos o Misionales Institucionales
- Monto de inversión actualizado : S/. 2,700,132.41
- Devengado acumulado : S/. 1,853,524.48
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 198,064.56
- Avance físico : 63.51 %
- Avance Financiero : 68.65 %

Proyectos ejecutados 2024



MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA J.V. BELEN, AV. CERRILLOS, SANTA FORTUNATA, ASOC. SAN VALENTIN, SAN CRISTOBAL DE LA J.V. CERRILLOS, ASOC. VILLA INGENIERIA DE LA J.V. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - COMPONENTE 01

CUI N° 2149005

- Brecha a la que responde : Servicio de Transporte Urbano
- Monto de inversión actualizado : S/. 16,076,042.00
- Devengado acumulado : S/. 15,301,225.19
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 2,724,269.36
- Avance físico : 91.00%
- Avance Financiero : 95.18 %

Proyectos ejecutados 2024



CONSTRUCCION DE CALZADA, SEÑALES DE TRAFICO, MURO DE CONTENCION Y VEREDA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) JUNTA VECINAL UNIDAD Y DESARROLLO POR SAMEGUA (UDEPS) DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

CUI N° 2556244

- Brecha a la que responde : Servicio de Transporte Urbano
- Monto de inversión actualizado : S/. 3,289,923.19
- Devengado acumulado : S/. 3,107,769.20
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 132,312.56
- Avance físico : 94.97%
- Avance Financiero : 94.46 %

Proyectos ejecutados 2024



RENOVACION DE CAMARA DE VALVULAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA

CUI N° 2541905

- Brecha a la que responde : Servicio de Agua Potable Urbano
- Monto de inversión actualizado : S/. 4,581,043.99
- Devengado acumulado : S/. 4,262,841.80
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 878,849.51
- Avance físico : 90.93%
- Avance Financiero : 93.05 %

Proyectos ejecutados 2024



**REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE ANTIGUA DE SAMEGUA DE
LA JUNTA VECINAL SAMEGUA DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA**

CUI N° 2542339

- Brecha a la que responde : Servicio de Transporte Urbano
- Monto de inversión actualizado : S/. 4,143,716.34
- Devengado acumulado : S/. 3,833,566.01
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 658,761.88
- Avance físico : 100.00%
- Avance Financiero : 92.52%

Consolidados de Mantenimientos ejecutados 2024

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO	COSTO TOTAL
1	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR DE OLLERIA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	CULMINADO	264,400.35
2	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN EN EL SECTOR DE YUNGUYO, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	CULMINADO	262,022.15
3	"LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN EN EL SECTOR EL MOLINO, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	CULMINADO	256,516.92
4	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUNA JARDÍN N° 159 LOS NIÑOS DE JESÚS DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	CULMINADO	90,573.56
5	MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FORTUNATA DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.	CULMINADO	95,774.36
6	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIA Y CAMBIO DE COMPUERTAS METÁLICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR YUNGUYO DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	CULMINADO	304,743.43
7	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION POR GALERIAS FILTRANTES EN EL SECTOR DE OLLERIA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	CULMINADO	480,580.24
8	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION POR GALERIAS FILTRANTES EN EL SECTOR DE YUNGUYO, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	CULMINADO	377,382.92

Fichas de mantenimiento ejecutadas en el 2024

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR DE OLLERIA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Breve descripción de intervención y/o metas: Se realizó limpieza y la descolmatación de la captación del sector de Ollería.

Costo : S/. 264,400.35
Plazo de ejecución : 45 Días calendarios
N° Trabajadores : 15

ANTES



DESPUÉS



Fichas de mantenimiento ejecutadas en el 2024

“LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN EN EL SECTOR DE YUNGUYO, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

Breve descripción de intervención y/o metas: Se realizó limpieza y la descolmatación de la captación del sector de Yunguyo.

Costo : S/. 262,022.15
Plazo de ejecución : 45 Días calendarios
N° Trabajadores : 15



Fichas de mantenimiento ejecutadas en el 2024

““LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN EN EL SECTOR EL MOLINO, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA””

Breve descripción de intervención y/o metas: Se realizó limpieza y la descolmatación de la captación del Anexo el Molino.

Costo : S/. 256,516.92

Plazo de ejecución : 45 Días calendarios

N° Trabajadores : 14



Fichas de mantenimiento ejecutadas en el 2024

“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUNA JARDÍN N° 159 LOS NIÑOS DE JESÚS DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA”

Breve descripción de intervención y/o metas: Se realizó mantenimiento a las aulas de la I.E. Cuna Jardín N° 159.

Costo : S/. 90,573.56
Plazo de ejecución : 15 Días calendarios
N° Trabajadores : 11



Fichas de mantenimiento ejecutadas en el 2024

“MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES SANITARIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FORTUNATA DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.”

Breve descripción de intervención y/o metas: Se realizó mantenimiento del sistema eléctrico de la I.E. Santa Fortunata

Costo : S/. 95,774.36

Plazo de ejecución : 20 Días calendarios

N° Trabajadores : 13

ANTES



DESPUÉS



Fichas de mantenimiento ejecutadas en el 2024

“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIA Y CAMBIO DE COMPUERTAS METÁLICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR YUNGUYO DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA”

Breve descripción de intervención y/o metas: Se realizó mantenimiento del sistema limpia y cambio de compuertas de la planta de tratamiento de agua potable en el sector de Yunguyo

Costo : S/. 304,743.43
Plazo de ejecución : 72 Días calendarios




Fichas de mantenimiento ejecutadas en el 2024

“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION POR GALERIAS FILTRANTES EN EL SECTOR DE OLLERIA, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

Breve descripción de intervención y/o metas: Se realizó mantenimiento de la infraestructura de captación por galerías filtrantes correspondientes al sector de Ollería.

Costo : S/. 480,580.24
Plazo de ejecución : 95 Días calendarios

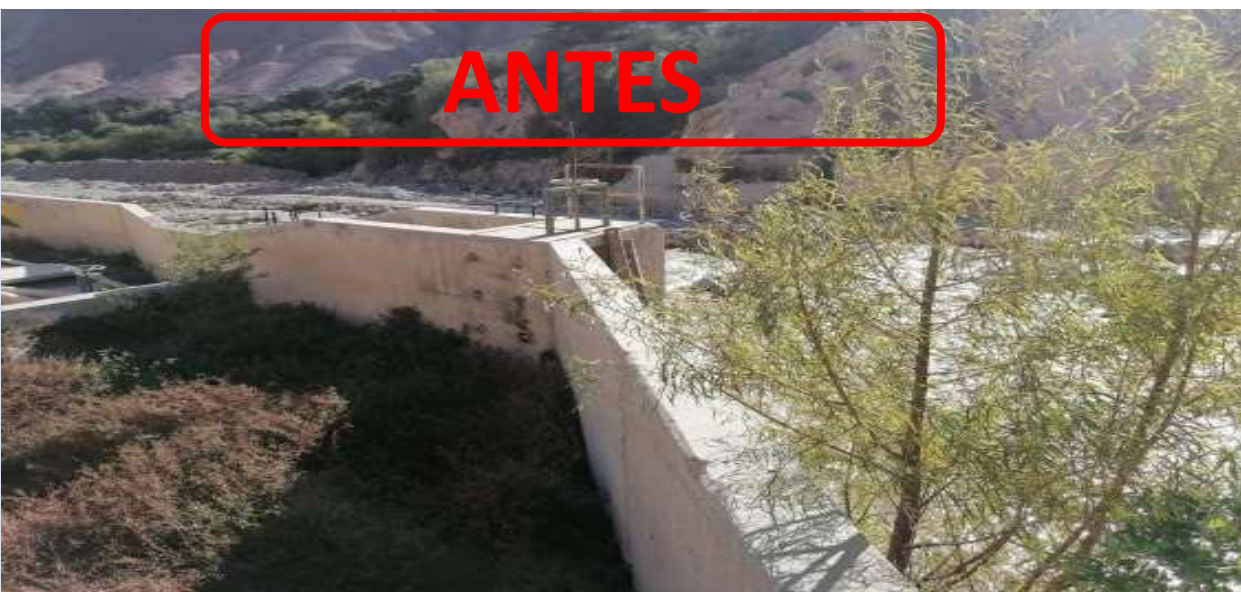

Fichas de mantenimiento ejecutadas en el 2024


“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION POR GALERIAS FILTRANTES EN EL SECTOR DE YUNGUYO, DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

Breve descripción de intervención y/o metas: Se realizó mantenimiento de la infraestructura de captación por galerías filtrantes correspondientes al sector de Yunguyo.

Costo : S/. 377,382.92
Plazo de ejecución : 60 Días calendarios



GERENCIA DE DESARROLO ECONÓMICO, SOCIAL Y PC

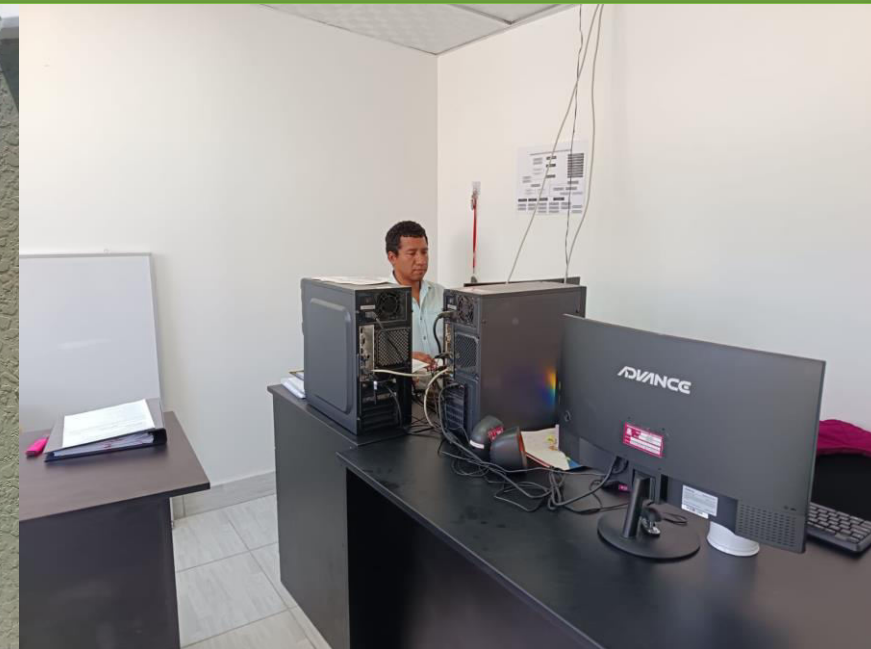

Julio C. Zeballos Salazar
Gerente de Desarrollo Económico Social y PC

Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados 2026-2028

Consolidados de Proyectos ejecutados PP 2024

Proyectos ejecutados Por Función	Estado Situacional	Monto Actualizado	Programación 2024	Devengado 2024	Devengado Acumulado	N° proyectos
Mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales de la unidad de servicios sociales de la Municipalidad Distrital de Samegua	En ejecución	2,877,062.95	643,917.00	639,117.19	642,955.00	01
Mejoramiento y fortalecimiento de capacidades en la prestación de servicios públicos administrativos de la Municipalidad Distrital de Samegua	En ejecución	S/ 4,168,638.79	1,665,640.39	1,421,306.17	3,459,851.77	01
Total		7,045,701.74	2,309,557.39	2,060,423.36	4,102,806.77	02

Proyectos ejecutados 2024

ANTES



DESPUÉS



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA,

CUI 2646260

- Brecha a la que responde: Ser. Operativos o misionales
- Monto de inversión actualizado: S/ 2,877,062,95
- Devengado acumulado: S/642,955.00
- Ejecutado 2024: S/639,117
- Avance físico: 23.60%
- Avance Financiero: 25.70%

Proyectos ejecutados 2024



MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA, **CUI 2193504**

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| • Brecha a la que responde | Infraestructura y Equipamiento |
| • Monto de inversión actualizado | S/4,168,638.79 |
| • Devengado acumulado | S/ 3,459,851.77 |
| • Ejecutado 2024 | S/ 1,421,306.17 |
| • Avance físico | 83.00% |
| • Avance Financiero | 88.66% |

Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental



C.P.C DELIA ROSA ACERO CALDERON
Gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental

Proyectos ejecutados 2024



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO – MOQUEGUA

CUI 2189259

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| • Brecha a la que responde | Seguridad Vecinal y Comunal |
| • Monto de inversión actualizado | S/ 5,922,969.58 |
| • Devengado acumulado | S/ 3,419,233.86 |
| • Ejecutado 2024 | S/ 830,075.60 |
| • Avance físico | 57.73% |
| • Avance Financiero | 59.30% |

Mantenimiento ejecutado 2024

ANTES



DESPUES



"MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA" CULMINADA

- Brecha a la que responde : Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
- Monto de Expediente : S/. 833,269.78
- Devengado Ejecutado : S/. 718,600.12
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 718,600.12
- Avance físico : 90.17%
- Avance Financiero : 86.24%

Mantenimiento ejecutado 2024



ANTES



DESPUES

“MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA” CULMINADA

- Brecha a la que responde : Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
- Monto de Expediente : S/. 945,048.30
- Devengado Ejecutado : S/. 852,573.56
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 852,573.56
- Avance físico : 96.80%
- Avance Financiero : 90.21%

Mantenimiento ejecutado 2024



**“MANT. Y RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RESIDUALES DE LAS
PRINCIPALES CALLES AV. PASAJES Y ARTERIAS DE DISTRITO DE
SAMEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA”**

CULMINADA

- Brecha a la que responde : Gerencia de Servicios Municipales y Gestión

Ambiental

- Monto de Expediente : S/. 1'372,571.11
- Devengado Ejecutado : S/. 1'037,719.58
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 1'037,719.58
- Avance físico : 96.67 %
- Avance Financiero : 75.60 %

Mantenimiento ejecutado 2024

“MANT. DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y ESPACIOS DE LA PLAZA CIVICA DEL DISTRITO DE SAMEGUA – MARISCAL NIETO – MOQUEGUA”

CULMINADA

- Brecha a la que responde : Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental
- Monto de Expediente : S/. 475,326.81
- Devengado Ejecutado : S/. 416,511.90
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 416,511.90
- Avance físico : 83.72 %
- Avance Financiero : 87.63 %



Mantenimiento ejecutado 2024

ANTES



DESPUES



“MANT. DEL AREA LIBRE DE MOSCA DE LA FRUTA DEL DISTRO DE SAMEGUA PROV. MRCAL. NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

CULMINADA

- Brecha a la que responde : Gerencia de Servicios Municipales y Gestión

Ambiental

- Monto de Expediente : S/. 1'019,077.32
- Devengado Ejecutado : S/. 868,808.77
- Ejecutado S/. 2024 : S/. 868,808.77
- Avance físico : 87.73 %
- Avance Financiero : 85.25 %

Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones



Ing. Elard Herrera
Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones

Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados 2026-2028

Consolidados de Proyectos en liquidación 2024 por AD

N°	CUI	AÑO	TIPO	PROYECTO Y/O OBRA	LIQUIDACION TECNICA/FINANCIERA		MONTO DE LIQ. TEC. S/.	MONTO DE LIQ. FIN. S/.	COSTO REAL DE OBRA S/	OBSERVACIONES
					LIQUIDACION FINANCIERA	LIQUIDACION TECNICA				
1	2159020	2012, 2017 y 2018	OBRA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CALLEJON LA BODEGUILLA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100%	100%	621,363.04	704,974.15	704,974.15	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE APROBACION DE ACTA DE APROBACION DE LIQUIDACION POR PARTE DE LA COMISION EVALUADORA
2	2106095	2009 - 2010	OBRA	CONSTRUCCION DE VEREDAS, JARDINERAS EN LA PRIMERA CUADRA DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE SAMEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.	100%	100%	294,651.00	298,300.46	298,300.46	SE ENCUENTRA EN ASESORIA JURIDICA
3	2044762	2007 - 2008	OBRA	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA LAS BEGONIAS EN LA JUNTA VECINAL SAMEGUA , DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100%	30%	0	320,176.47	320,176.47	SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LIQUIDACIONES
4	SIN SNIP	2008-2009	OBRA	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA VILLA INGENIERIA COMITE N° 10	0%	0%	0	0	0	NO TIENE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (FALTA DOCUMENTACION)
5	2235355	2015	PROYECTO	INSTALACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100%	100%	0	6,248.75	6,248.75	SE ENCUENTRA EN ASESORIA JURIDICA (SOLO COMTEMPLA PAGO DE PLANILLAS)
6	2116288	2010 - 2011	PROYECTO	ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPAL Y PLAN DE DESARROLLO URBANO EN SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100%	95%	0	292,893.35	253,872.81	SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LIQUIDACIONES (NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO DE LIQUIDACION POR FALTA DE DOCUMENTACION TECNICA)
7	2089629	2009 - 2010	PROYECTO	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENIL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS JOVENES DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100%	100%	80,962.73	78,353.47	77,863.47	SE ENCUENTRA EN ASESORIA JURIDICA
8	2008302	2005 AL 2009	OBRA	APERTURA VIAL SAMEGUA - QUEBRADA EL CEMENTERIO	25%	20%	0		0	SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LIQUIDACIONES PARA CULMINACION

Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados 2026-2028

Consolidados de Proyectos en liquidación 2024 por Servicio

N°	CUI	AÑO	TIPO	PROYECTO Y/O OBRA	LIQUIDACION TECNICA/FINANCIERA		MONTO DE LIQ. TEC. S/.	MONTO DE LIQ. FIN. S/.	COSTO REAL DE OBRA S/	OBSERVACIONES
					LIQUIDACION FINANCIERA	LIQUIDACION TECNICA				
1	2049194	2009 AL 2010	OBRA	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION COMITE 13 LA VICTORIA Y ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO PEDREGAL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100%	100%	485,460.56	551,919.75	547,549.75	SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LIQUIDACIONES PARA REVISION
2	2145486	2011 al 2014 y 2016 al 2019	OBRA	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS SECTORES RURALES DE CHIRILO, SAMEGUA, CERRILLOS, ESCAPALAUQUE Y SANCARA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100%	100%	0	1,971,559.13	1,967,859.13	SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LIQUIDACIONES PARA REVISION (NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO DE LIQUIDACION POR FALTA DE DOCUMENTACION TECNICA)
3	2198698	2014 AL 2016	PROYECTO	INSTALACION FORESTAL Y REFORESTACION URBANA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100%	100%	366,199.69	320,220.29	320,220.29	SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LIQUIDACIONES PARA REVISION
4	2198916	2014 AL 2015	OBRA	INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA 10 DE MAYO Y ALTO SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100%	100%	191,664.28	284,002.76	284,002.76	SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LIQUIDACIONES PARA REVISION
5	2048848	2007 - 2008	OBRA	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA JUNTA VECINAL UNION POR EL DESARROLLO DE SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.	100%	100%	439276.48	437181.61	431442.61	SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LIQUIDACIONES PARA REVISION
6	2063719	2008 AL 2010	OBRA	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE SINCHI ROCA, CUADRA DOS DE LA JUNTA VECINAL BELÉN, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100%	100%	409,534.21	418,249.40	418,249.40	SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LIQUIDACIONES PARA REVISION
7	2042058	2007	OBRA	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE PEDRO RUIZ GALLO EN LA ASOCIACION VILLA INGENIERIA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100%	100%	182,782.78	192,548.13	192,548.13	SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LIQUIDACIONES PARA REVISION
8	2056073	2007 - 2008	OBRA	CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS LA INMACULADA CONCEPCION DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA	100%	100%	909,950.78	977,105.57	973,255.57	SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LIQUIDACIONES PARA REVISION
